

## 1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，  
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



## 2 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成95%，  
首层回填完成，窗框、栏杆安装完成，  
外墙保温开始施工



## 3 号楼（6F）

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框栏杆安装完成，首层回填完成，  
外墙保温完成20%





## 4 号楼（6F）

---

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框栏杆安装完成，首层地坪钢筋  
绑扎，外保温完成20%

---



## 5 号楼（6F）

---

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框、栏杆安装完成，首层地坪钢筋  
绑扎，外墙保温完成40%

---



## 6 号楼（15F）

---

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框  
安装完成，外墙保温完成60%，新风系  
统安装，电梯安装

---



## 7 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成82%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装施工完成70%



## 8 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成82%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
开始安装，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装完成70%



## 9 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成80%，  
窗框安装完成，吊篮安装完成，电  
梯安装



## 10 号楼 (8+1F)

---

室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成50%，外墙保温完成20%

---




## 11 号楼 (8+1F)

---

外墙保温完成90%，外墙涂料完成75%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成5%

---

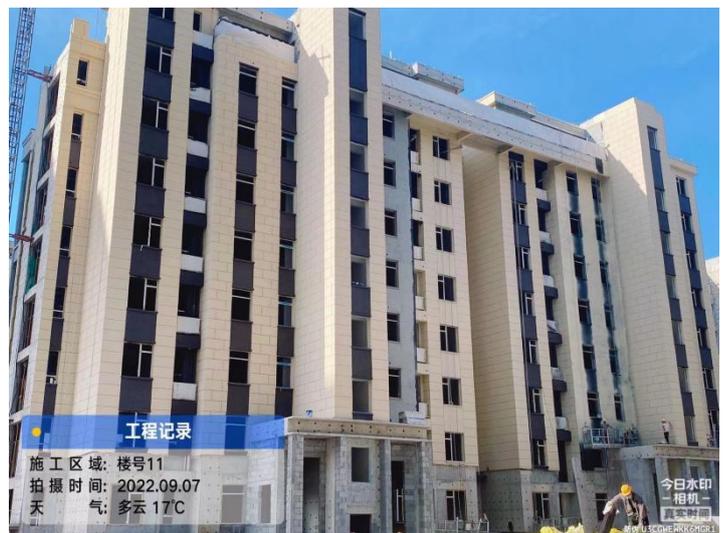

## 12 号楼 (17F)

---

室内砌体完成，内墙抹灰完成70%，窗框安装完成，给水完成50%

---



## 13 号楼（8+1F）

外墙保温完成75%，外墙涂料完成20%，  
室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰  
完成，地暖完成，精装修完成43%



## 14 号楼（18F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，  
窗框安装完成，外墙保温完成75%，  
外墙涂料完成20%，室内给水完成，  
地暖完成50%



## 15 号楼（18F）

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙  
抹灰完成85%



## 16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，外墙保温完成75%，外墙涂料完成30%，室内给水完成80%，新风系统安装完成，精装完成10%



## 室外

土方回填完成20%，围墙完成50%，小市政、景观单位进场



## 地下

地库主体完成，砌体完成85%，抹灰完成60%，安装完成70%，装饰完成60%，地坪开始施工

