

1 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，
室内精装修完成45%



3 号楼（15F）

外立面保温完成93%，外墙涂料完成
40%，精装修完成15%




4 号楼 (6F)

室内砌体完成, 抹灰完成, 窗框
开始安装



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%, 外墙涂料完成73%,
室内精装完成45%

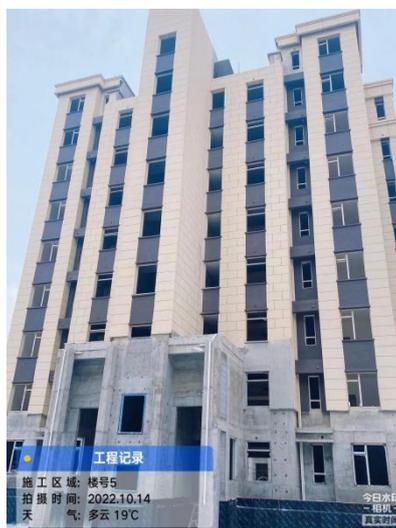

6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成80%,
室内精装完成50%



7 号楼（16F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成60%，
室内精装修完成30%



8 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成40%



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，外墙涂料完成75%，
室内精装完成30%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成55%，
精装完成30%



11 号楼 (16F)

室内地辅热盘管30%，外墙保温完
成55%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成70%，
精装修进场



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成53%，
精装进场，包电梯门套完成40%



14 号楼 (15F)

室内砌体、抹灰完成，室内地辐热
保护层浇筑完成



15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成97%，涂料完成70%，
室内地辐热施工完成



19 号楼（16F）

窗框安装完成，外保温完成65%，室内精装修完成15%



20 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成65%，
室内地辐射热盘保护层浇筑完成



21 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，西单元地辐射热
保护层浇筑完成，东单元地辐射热盘管完成
90%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成99%，室外回填土完成18%



地下

地库二构及抹灰施工完成，一遍腻子完成60%，顶棚涂料完成40%，地坪浇筑完成10%；桥架安装48%，消防风管安装9%

