

空港绿地新城六期项目进度（3月3日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成88%，真石漆完成55%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成86%，户内门完成85%，橱柜、浴室柜完成95%，木地板完成，插座完成95%



3 号楼（15F）

外立面保温、真石漆完成96%，一体板完成86%，西单元贴砖完成，腻子完成，东单元贴砖完成70%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成80%，
真石漆完成35%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板
完成，户内门完成85%，橱柜、浴室柜
完成，木地板完成，插座完成95%



6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板
完成，户内门完成85%，橱柜、浴室柜
完成，木地板完成，插座完成95%



7 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成88%，
户内墙地砖完成，铝扣板吊顶
完成80%，插座安装80%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成63%，真
石漆完成30%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，
户内真石漆、橱柜、浴室柜完成，铝扣
板吊顶完成，户内门完成80%，插座完成80%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温、真石漆、一体板完成，
户内乳胶漆、铝扣板完成，橱柜、浴室柜
完成90%，户内门完成80%



11 号楼 (16F)

外墙保温完成98%，真石漆完成96%，一
体板完成82%，户内墙地砖完成，腻子
完成85%，铝扣板吊顶完成30%，浴室
柜完成



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成75%，公区
吊顶完成，西单元户内及公区贴地砖完成
40%，东单元完成20%



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成83%，玻璃安装完成24%，公区贴砖完成，户内完成20%，吊顶完成10%，一体板完成10%




14 号楼 (15F)

外墙保温完成67%，户内吊顶完成，墙面腻子完成，公区腻子完成30%



15 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成73%，室内墙面粉刷、找平完成，吊顶完成20%

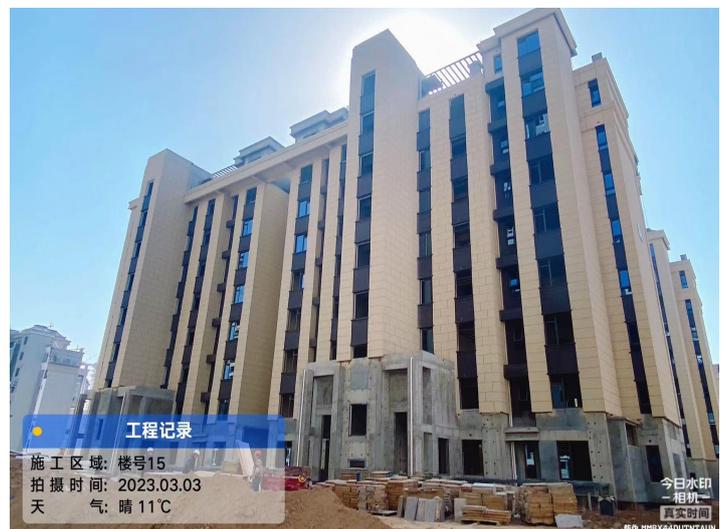

16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙真石漆完成80%，
玻璃安装完成30%，户内及公区贴砖完
成30%，吊顶完成10%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成42%，室内
电梯安装完成，墙面冲筋开始



18 号楼（16F）

窗框安装完成，室内吊顶完成，
墙面腻子完成70%，客厅贴砖完成40%



19 号楼（16F）

外保温完成98%，真石漆完成78%，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成80%，防水完成90%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙真石漆完成80%，东单元户内墙面找平完成40%，西单元上料，窗框完成



21 号楼（15F）

窗框安装完成80%，外墙保温完成25%，电梯调试中



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成63%，
景观完成49%



地下

地库二遍腻子完成65%，顶棚涂料完成
95%，水泥固化地坪完成45%，划线20%，
桥架安装75%，消防通风管安装62%

