

## 空港绿地新城六期项目进度（5月5日）

### 1 号楼（6F）

窗框完成95%，外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成90%，挂板完成32%，室外给水及热力、电力管网完成80%。



### 2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



### 3 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内涂料、橱柜、浴柜、户内门、木地板、踢脚线完成、角阀花洒、油烟机完成，一遍精保洁完成。



## 4 号楼（6F）

窗框安装完成95%，外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成55%，挂板完成30%，室外管网完成65%。



## 5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 7 号楼（16F）

---

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。

---



工程记录  
施工区域: 楼号7  
拍摄时间: 2023.05.04  
天气: 多云 18℃

## 8 号楼（6F）

---

窗框完成95%，外墙保温完成，真石漆  
完成，一体板钢架完成15%，室外热力  
管网完成90%。

---



工程记录  
施工区域: 楼号8  
拍摄时间: 2023.05.04  
天气: 多云 18℃

## 9 号楼（8+1F）

---

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。

---



工程记录  
施工区域: 楼号9  
拍摄时间: 2023.05.04  
天气: 多云 18℃

## 10 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 11 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安  
装完成，一体板钢架完成35%，公区墙地  
砖、吊顶完成，室内墙地砖完成98%，二  
遍腻子完成，打磨完成60%。



## 13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，公区墙地砖完成，户内墙地砖完成，户内涂料完成85%，一体板完成95%。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成95%，真石漆完成85%，户内吊顶完成，公区腻子完成80%，户内贴砖完成，腻子完成90%。



## 15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成95%，一体板钢架完成30%，室内墙地砖完成90%，二遍腻子完成，打磨完成60%。



## 16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成，一体板钢架完成40%，玻璃安装完成95%，户内贴砖完成，室内涂料完成90%。




## 17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成95%，真石漆完成45%，室内墙面找平完成，吊顶封板完成20%，贴砖完成35%。



## 18 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成95%，真石漆完成25%，室内吊顶完成，墙顶面腻子完成，室内贴砖完成95%。

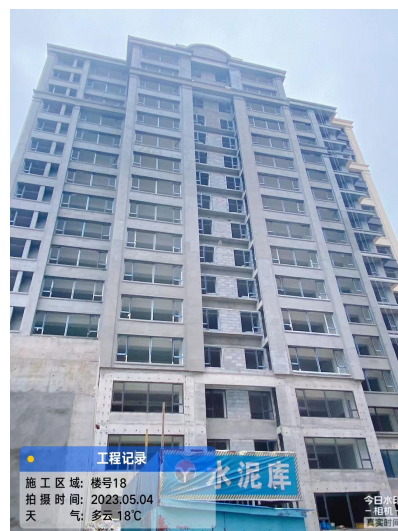

19 号楼 (16F)

外保温完成, 真石漆完成, 玻璃安装完成, 一体板钢架完成60%, 户内贴砖完成, 室内涂料完成。



## 20 号楼 (15F)

外墙保温完成,真石漆完成,玻璃安装完成95%,户内贴砖完成90%,吊顶封板完成,二遍腻子完成40%。



## 21 号楼 (15F)

窗框安装完成, 外墙保温完成85%, 真石漆完成10%, 东单元墙面找平完成95%, 包管道完成, 西单元墙面找平完成70%。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，  
室外回填土完成90%，小市政完成78%，  
景观完成68%。



## 地下

地库二遍腻子完成95%，顶棚涂料完成，  
水泥固化地坪完成85%，划线完成70%，桥  
架安装85%，消防通风管安装75%，消防水  
安装完成75%。

