

# 空港绿地新城五期项目进度（5月12日）

## 1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成90%，内粉完成，真石漆完成40%，户内水管完成，墙面找平完成70%。



## 2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，吊顶完成，铝扣板完成，墙地砖完成，乳胶漆完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，五金洁具完成。



## 3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，吊顶完成，墙地砖完成，铝扣板完成，乳胶漆完成，户内门完成，淋浴屏完成，橱柜完成，五金洁具完成80%。





## 4 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
吊顶完成，墙地砖完成，乳胶漆完成，  
铝扣板完成，户内门完成，淋浴屏完成，  
玻璃完成，橱柜完成，五金洁具完成80%。



## 5 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，  
乳胶漆完成，墙地砖完成，木地板完成，  
橱柜完成，淋浴隔断完成，部品部件安装  
完成，五金洁具完成。



## 6 号楼（15F）

内粉完成，二遍防水完成，外保温完成  
80%，真石漆完成35%，地暖完成，墙面找  
平完成，木地板找平完成80%，吊顶基  
层完成70%。



## 7 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成，橱柜完成，户内门完成，淋浴隔断完成，部品部件安装完成，五金洁具完成。



## 8 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成，橱柜完成，淋浴隔断完成，户内门完成，部品部件安装完成，五金洁具完成80%。



## 9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成，橱柜完成，淋浴隔断完成，户内门完成，乳胶漆完成，五金洁具完成80%。





## 10 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成50%，玻璃完成，吊顶基层完成，穿线完成，墙地砖完成，腻子完成80%，木地板基层完成。



## 11 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成80%，玻璃安装完成，吊顶穿线完成，封板完成，墙面找平完成，墙地砖完成，墙面腻子完成60%。




## 12 号楼（8+1F）

吊顶封板完成，墙地砖完成，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，墙面腻子完成60%。




### 13 号楼（16F）

内粉完成，粉刷石膏完成，栏杆完成50%，  
外保温完成80%，窗框完成，屋面瓦完成，  
真石漆完成35%，地暖管线完成，地暖保  
护层完成70%，墙面找平完成60%。

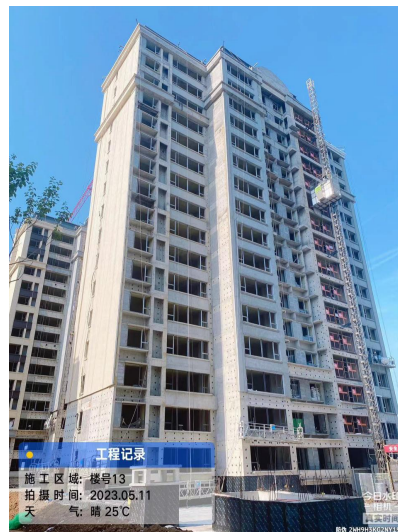


### 14 号楼（15F）

户内水管完成，内粉完成，栏杆完成  
80%，窗框完成，外保温完成85%，真石漆  
完成60%，防水施工完成，地暖盘管完成70%。

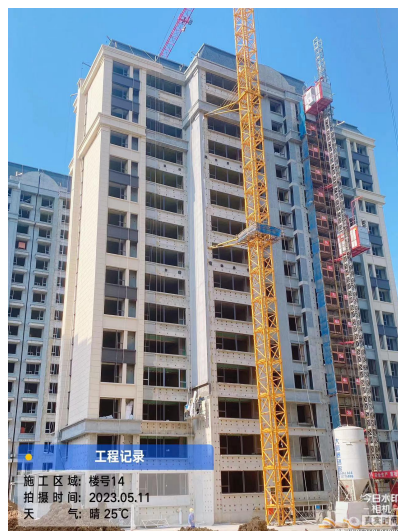

### 15 号楼（8+1F）

吊顶封板完成，墙地砖完成，外保温  
完成，真石漆完成，一体板完成92%，  
玻璃完成，墙面腻子完成40%。

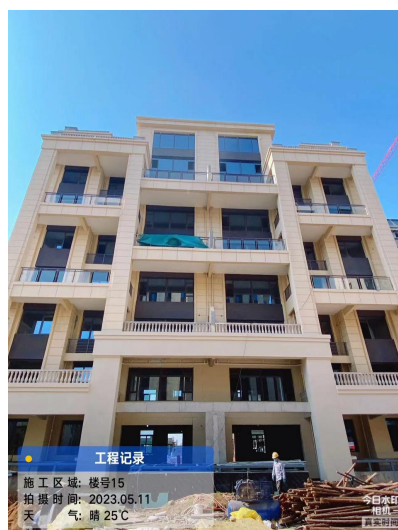



## 16 号楼（8+1F）

吊顶封板完成，墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，一体板完成92%，墙面腻子完成60%。



## 17 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成90%，玻璃完成，墙面找平完成，包管道完成，吊顶基层完成90%，木地板找平完成80%。



## 18 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成，地暖保护层完成，窗框完成，外保温完成40%，木地板找平完成80%，吊顶龙骨完成20%，墙面找平完成20%。



## 19 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成95%，玻璃完成，墙地砖完成，墙面找平完成，吊顶基层完成，腻子完成40%。



## 20 号楼（17F）

户内水管完成，地暖保护层浇筑完成，内粉完成，窗框完成，外保温完成80%，墙面找平完成50%，吊顶龙骨完成30%。



## 21 号楼（15F）

内粉完成，栏杆安装完成35%，窗框完成，外保温完成85%，给水完成，防水完成。





## 22 号楼（17F）

屋面施工完成，内粉完成，外保温完成60%，真石漆完成10%，给水完成，防水完成。



## 23 号楼（16F）

屋面施工完成，窗框安装完成，内粉完成，外保温完成40%，给水完成70%。



## 车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成60%，车库顶板防水施工完成70%，保护层浇筑完成70%，回填土完成65%，小市政完成55%，景观完成45%。

