

空港绿地新城六期项目进度（7月4日）


1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成25%，一体板钢架完成，挂板完成70%，公区装修完成25%，室外管网完成，消防环路基层完成80%。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成15%，一体板钢架完成56%，挂板完成35%，大堂干挂龙骨完成，室外管网完成。

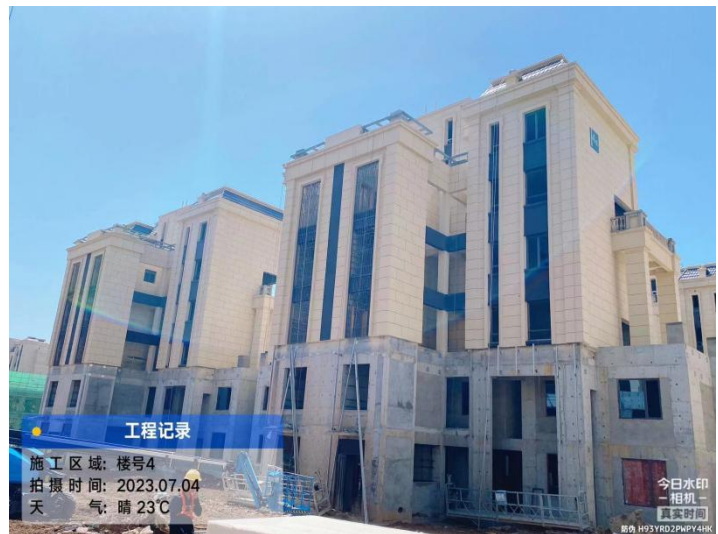

8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成25%，玻璃安装完成15%，公区干挂龙骨完成，室外管网完成，消防路基完成40%。



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 真石漆完成98%, 玻璃安装完成, 一体板钢架完成98%, 室内墙地砖完成98%, 涂料完成, 户内门完成, 橱柜、浴柜完成, 公区装修完成, 一层大堂贴砖、吊顶完成, 进户门完成, 厨卫洁具到场。



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 真石漆完成, 玻璃安装完成, 一体板完成98%, 室内及公区墙地砖完成, 涂料完成, 户内门完成, 橱柜、浴柜完成, 进户门安装完成, 厨卫洁具到场。



14 号楼 (15F)

外墙保温完成, 真石漆完成98%, 窗扇安装完成, 一体板钢架完成45%, 室内墙地砖完成, 吊顶、腻子完成, 窗台石安装完成, 公区地砖及腻子完成, 淋浴屏到场。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成，挂板完成40%，室内墙地砖完成98%，涂料完成，户内门安装完成，橱柜、浴柜安装完成，入户门安装完成，厨卫洁具到场。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成，玻璃安装完成95%，室内墙地砖、涂料完成，户内门完成，橱柜、浴柜安装完成，进户门安装完成，厨卫洁具到场。



17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，室内及公区墙地砖完成，吊顶完成，窗台石完成，二遍腻子完成95%。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成85%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子完成，贴砖完成，窗台板完成，玻璃到场安装。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成，挂板完成30%，室内墙地砖、吊顶、涂料完成，户内门安装完成，木地板完成，橱柜、浴柜安装完成，开关插座完成30%，进户门安装完成，一层大堂墙地砖完成80%。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成40%，室内墙地砖完成，涂料完成95%，户内门安装完成30%，一层大堂精装完成95%。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成85%，东单元墙面找平完成，吊顶封板完成，腻子完成30%，厨卫贴砖完成95%，西单元墙面找平完成，吊顶封板完成，厨卫贴砖完成45%。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成95%，二批次景观路硬化完成90%，东入口挡墙及台阶、水景结构完成，西入口水景及景观亭基础施工完成30%。



地下

车库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成92%，顶棚涂料完成，地坪完成95%，划线完成80%，机电桥架安装90%，消防通风管安装86%，消防水安装完成82%。

